tanz

Tanzhaus Donauwörth
Grobzeitplan
trint+kreuder d.n.a. Architekten PartGmbB
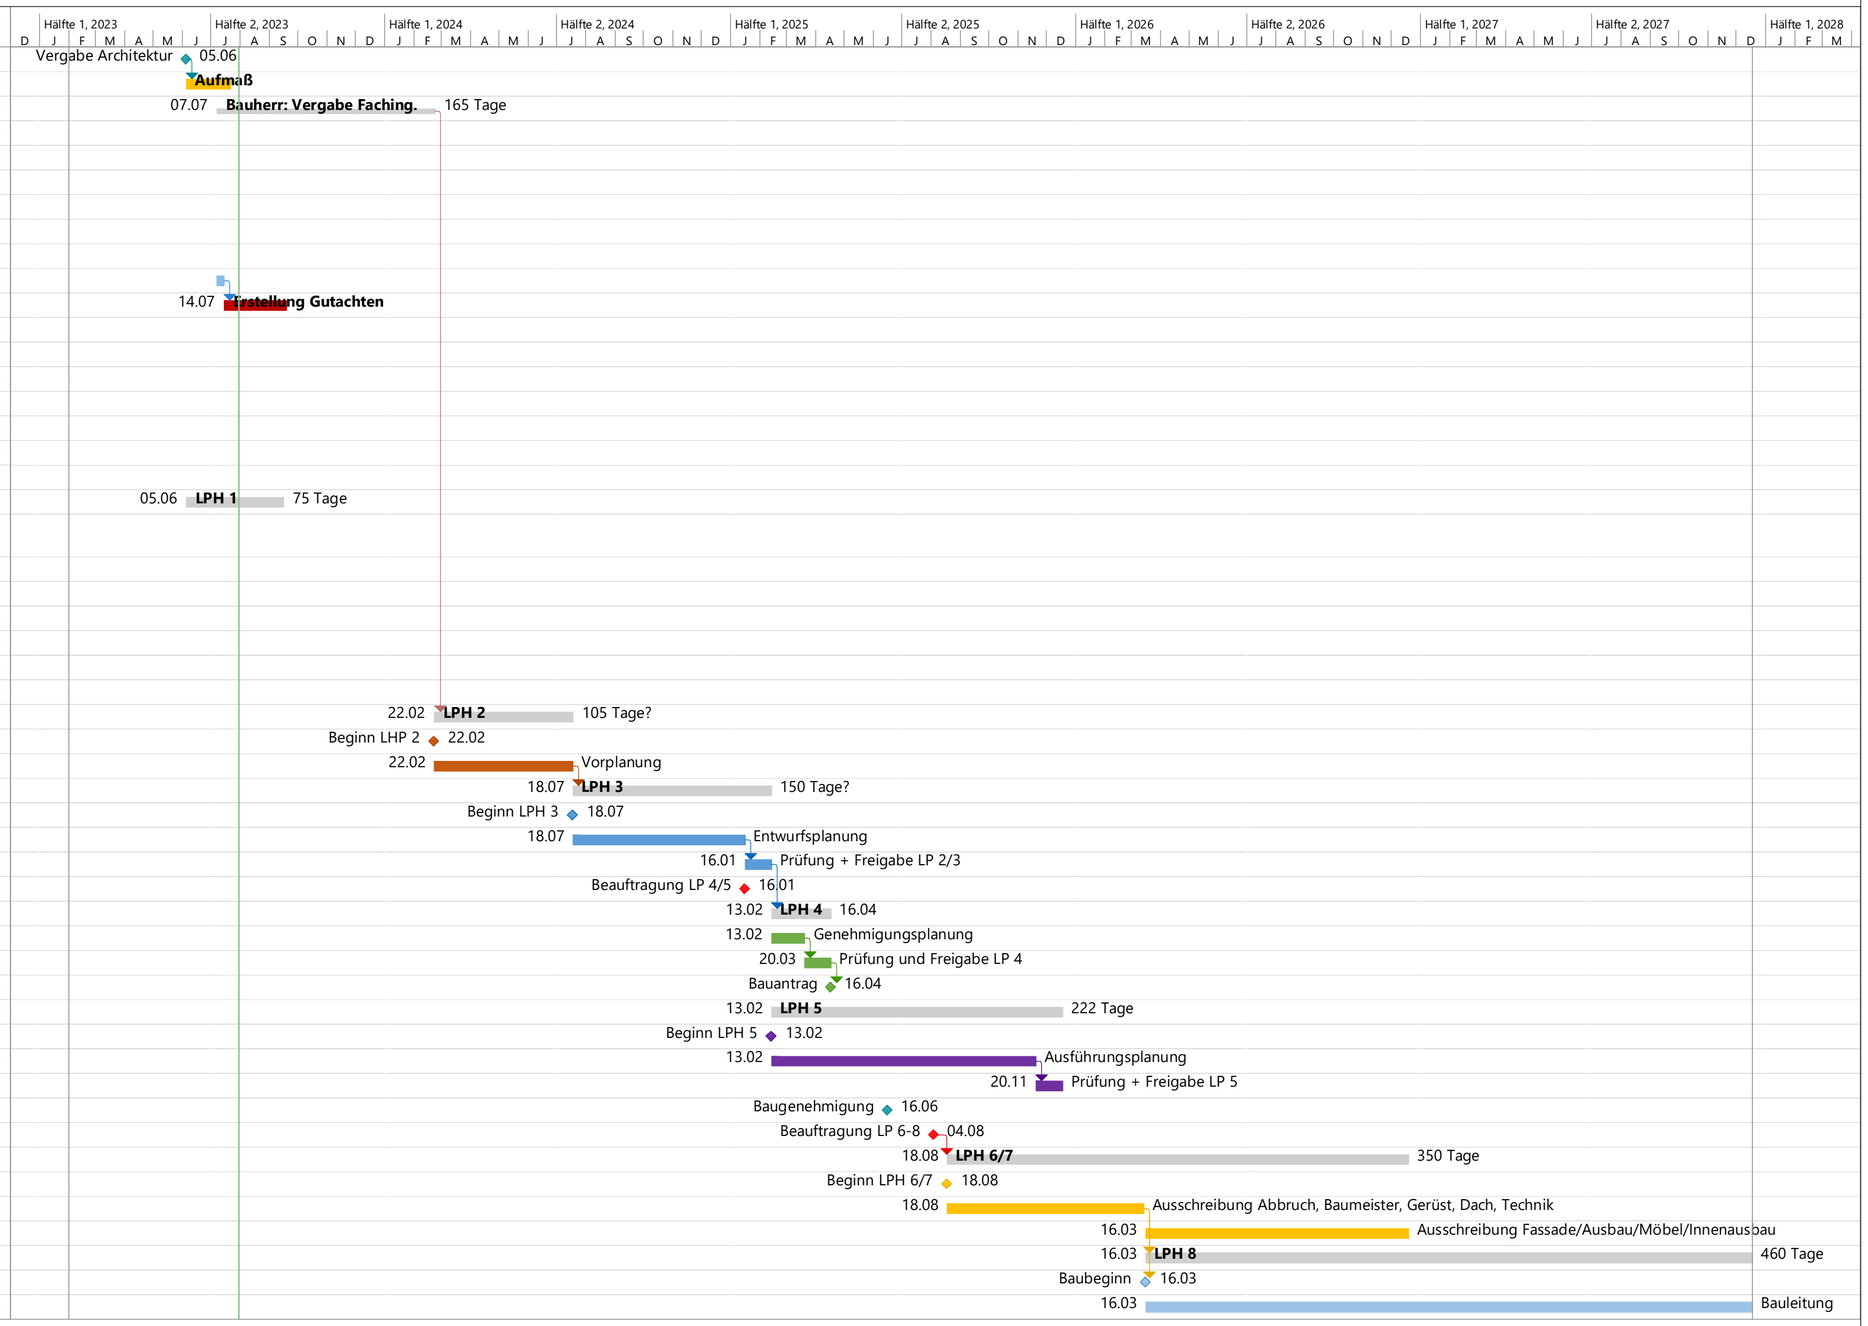
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	Vergabe Architektur	0 Tage	05.06.23	05.06.23
2	Aufmaß	35 Tage	05.06.23	21.07.23
3	**Bauherr: Vergabe Faching.**	**165 Tage**	**07.07.23**	**22.02.24**
4	Statik			
5	Bauphysik			
6	HLS			
7	ELT			
8	Brandschutz			
9	Landschaftsarchitektur			
10	**Bauherr: Bauftragung Gutachten**	**6 Tage**	**07.07.23**	**14.07.23**
11	**Erstellung Gutachten**	**46 Tage**	**14.07.23**	**18.09.23**
12	Schadstoffgutachten			
13	Baugrundgutachen			
14	Betontechnologische Untersuchung			
15	Barrierefreigutachten			
16	Verkehrsgutachten			
17	Artenschutzgutachten			
18	**Entrümpelung**			
19	**LPH 1**	**75 Tage**	**05.06.23**	**15.09.23**
20	Sichtung u Einarbeitung Bestandsunterlagen			
21	Workshops mit Nutzenden			
22	Sichtung Gutachten			
23	Fotodokumentation			
24	Vorkonzept Brandschutz			
25	Vorabstimmungen Denkmalpflege			
26	Vorabstimmungen Stadt			
27	**LPH 2**	**105 Tage**	**22.02.24**	**17.07.24**
28	Beginn LHP 2	0 Tage	22.02.24	22.02.24
29	Vorplanung	105 Tage	22.02.24	17.07.24
30	**LPH 3**	**150 Tage**	**18.07.24**	**12.02.25**
31	Beginn LPH 3	0 Tage		
32	Entwurfsplanung	130 Tage	18.07.24	15.01.25
33	Prüfung + Freigabe LP 2/3	20 Tage	16.01.25	12.02.25
34	**Beauftragung LP 4/5**	0 Tage	16.01.25	16.01.25
35	**LPH 4**	**45 Tage**	**13.02.25**	**16.04.25**
36	Genehmigungsplanung	25 Tage	13.02.25	19.03.25
37	Prüfung und Freigabe LP 4	20 Tage	20.03.25	16.04.25
38	Bauantrag	0 Tage	16.04.25	16.04.25
39	**LPH 5**	**222 Tage**	**13.02.25**	**19.12.25**
40	Beginn LPH 5	0 Tage		
41	Ausführungsplanung	200 Tage	13.02.25	19.11.25
42	Prüfung + Freigabe LP 5	20 Tage	20.11.25	17.12.25
43	**Baugenehmigung**	0 Tage	16.06.25	16.06.25
44	**Beauftragung LP 6-8**	0 Tage	04.08.25	04.08.25
45	**LPH 6/7**	**350 Tage**	**18.08.25**	**18.12.26**
46	Beginn LPH 6/7	0 Tage		
47	Ausschreibung Abbruch, Baumeister, Gerü	150 Tage	18.08.25	13.03.26
48	Ausschreibung Fassade/Ausbau/Möbel/In	200 Tage	16.03.26	18.12.26
49	**LPH 8**	**460 Tage**	**16.03.26**	**17.12.27**
50	Baubeginn	0 Tage	16.03.26	16.03.26
51	Bauleitung	460 Tage	16.03.26	17.12.27
